





**Plano Plurianual de  
Ação Governamental – PPAG**



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
**O Poder do Cidadão**

O futuro de Minas passa pela Assembleia

# Revisão do PPAG 2008-2011

Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura  
Logística da Fronteira AgroIndustrial

Órgão Responsável: Secretaria de Estado de  
Transportes e Obras Públicas

Gerente do Projeto: Eugênio Botinha



## Objetivo do Projeto

- Prover infra-estrutura multimodal de transporte, contribuindo para a redução dos custos logísticos de empreendimentos agrícolas e agroindustriais instalados ou em instalação no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas.
- Completar a integração intra e inter-regional através da implantação de ligações rodoviárias faltantes (missing links) e terminais intermodais de transporte.
- Melhorar os níveis de fluidez e segurança do tráfego nos principais corredores viários da região.



## **Escopo do Projeto**

- Pavimentação e Restauração de Rodovias no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas
- Terminais Hidroviários nos Rios Grande e Paranaíba



## Premissas do Projeto

- Ampliação do escopo setorial de intervenção e da abrangência geográfica do Projeto “Potencialização da Infra-Estrutura do Triângulo e Alto Paranaíba”
- Recomendações do Plano Estratégico de Logística de Transportes (PELT-Minas) para a região
- Lei Estadual nº 12.276/96 – Contratos de parcerias com empresas privadas



# Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

**Ação:** 1272 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS REGIOES

**Produto:** PROJETO CONCLUÍDO

**Unidade de Medida:** PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Central	1	0	0,00	674.824,00	0,00	0,00
Centro Oeste	3	0	0,00	4.182.235,00	0,00	0,00
Sul de Minas	3	0	0,00	1.352.941,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




# Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

## Pavimentação das Rodovias do Centro Oeste

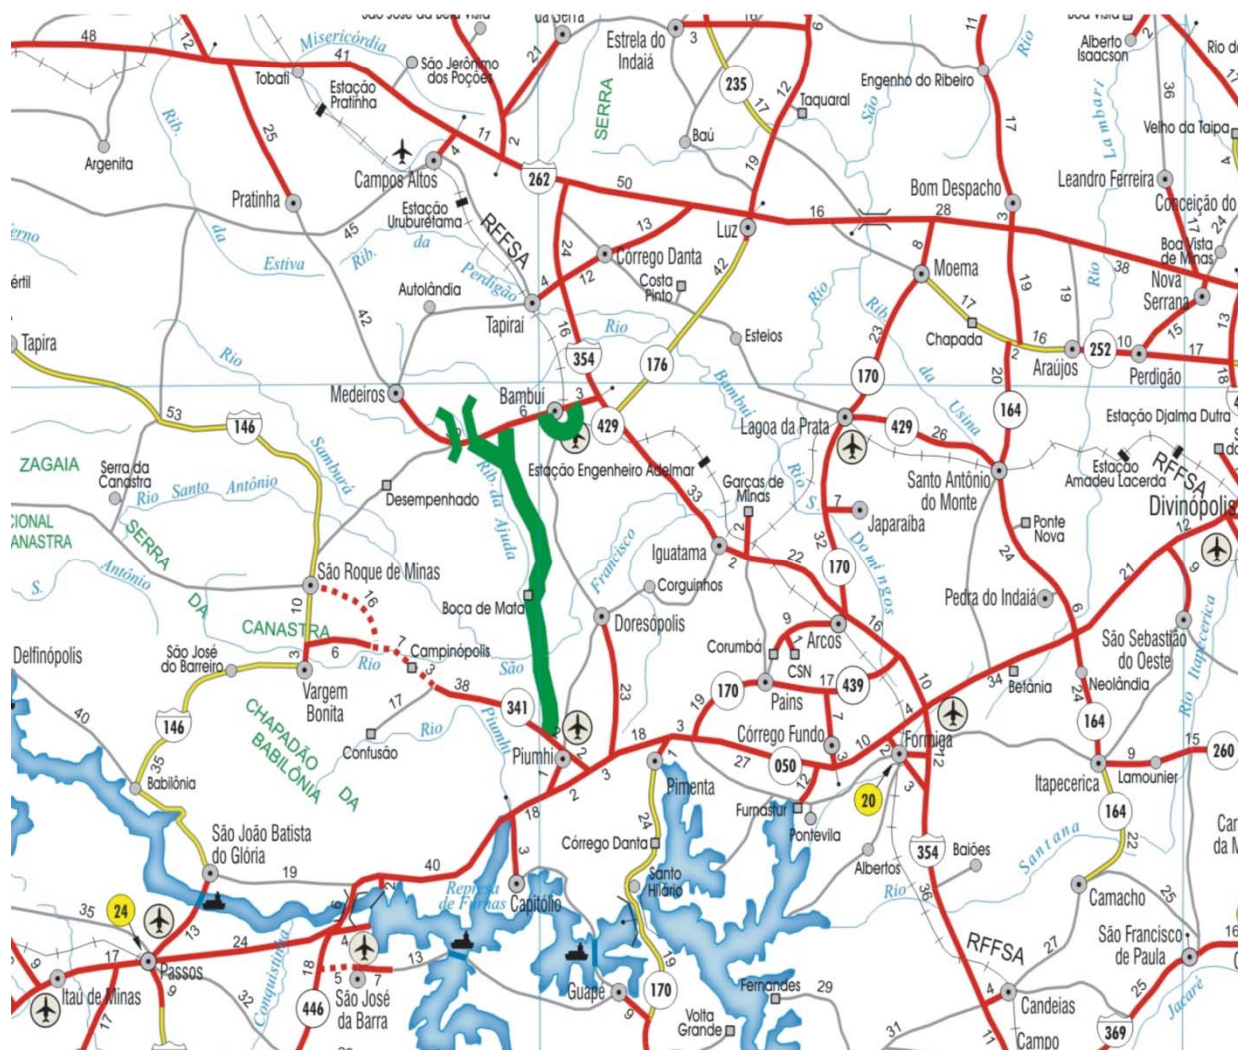

### Resumo

 Projetos

Projetos	67,60 km
----------	----------



## Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

**Ação:** 1012 - IMPLANTAÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

**Produto:** PROJETO CONCLUÍDO

**Unidade de Medida:** PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Triângulo	2	0	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

**Ação:** 1353 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

**Produto:** PROJETO CONCLUÍDO

**Unidade de Medida:** PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Alto Paranaíba	0	0	0,00	2.038.539,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	0,00	13.779,97	-
Sul de Minas	0	0	0,00	4.146.973,00	0,00	0,00
Triângulo	5	0	0,00	48.950.330,00	1.380.671,39	2,82
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.135.842,00</b>	<b>1.394.451,36</b>	<b>2,53</b>




# Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

## Pavimentação das Rodovias de Apoio ao Setor Produtivo do Triângulo e Alto Paranaíba

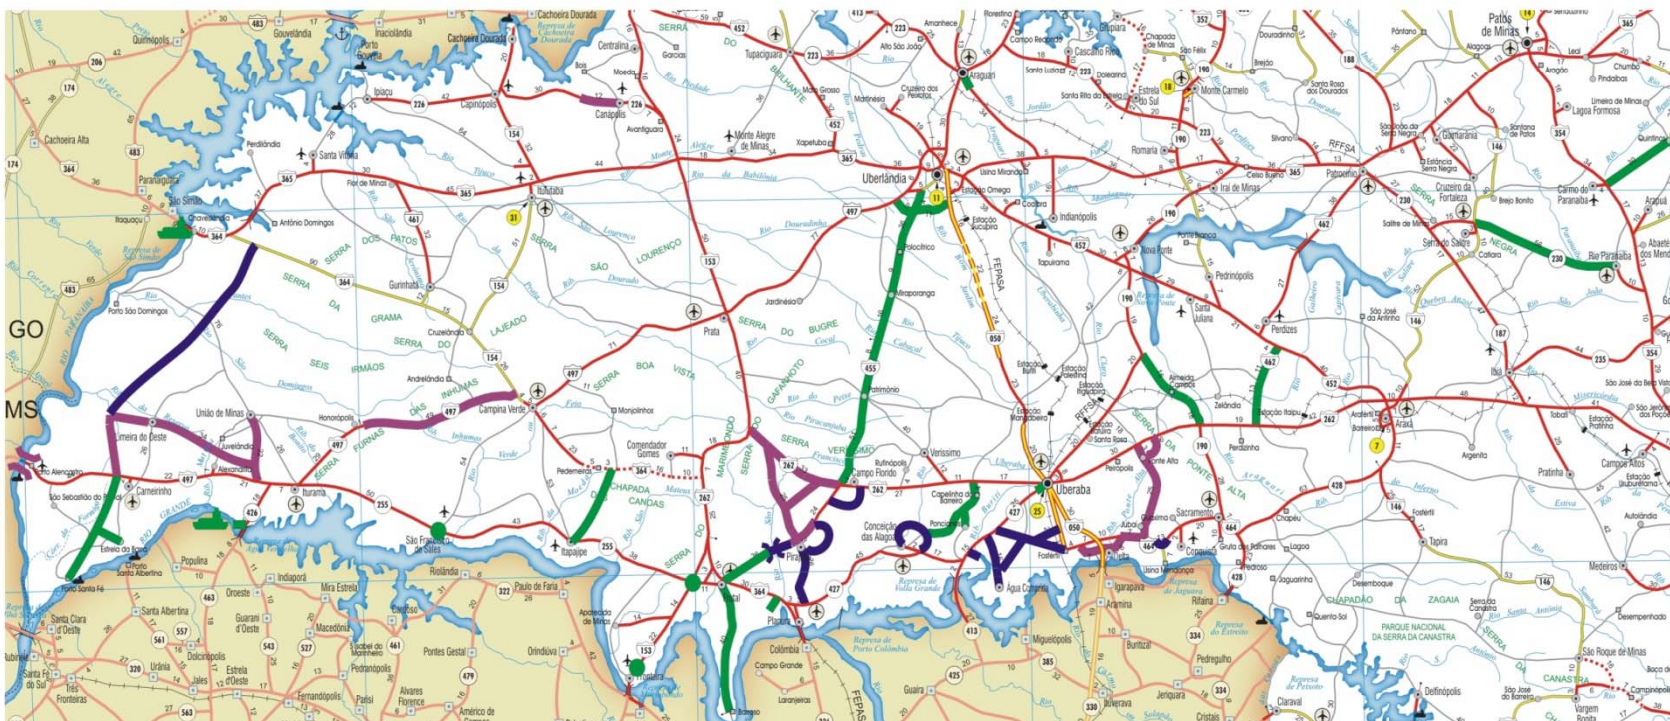

### Resumo

- Obra Concluída/Andamento
- Obra Contratada/A Licitar
- Projetos

	Obra		
	Contrato (km)	Concluída (km)	Projetos (km)
Tesouro	101,50	85,90	381,00
Parceria	526,10	217,70	308,40

Projetos	
Portos	2



# Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

**Ação:** 1354 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO NOROESTE DE MINAS

**Produto:** PROJETO CONCLUÍDO

**Unidade de Medida:** PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Estadual	0	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	4	0	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




# Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembléia

## Pavimentação das Rodovias do Noroeste de Minas

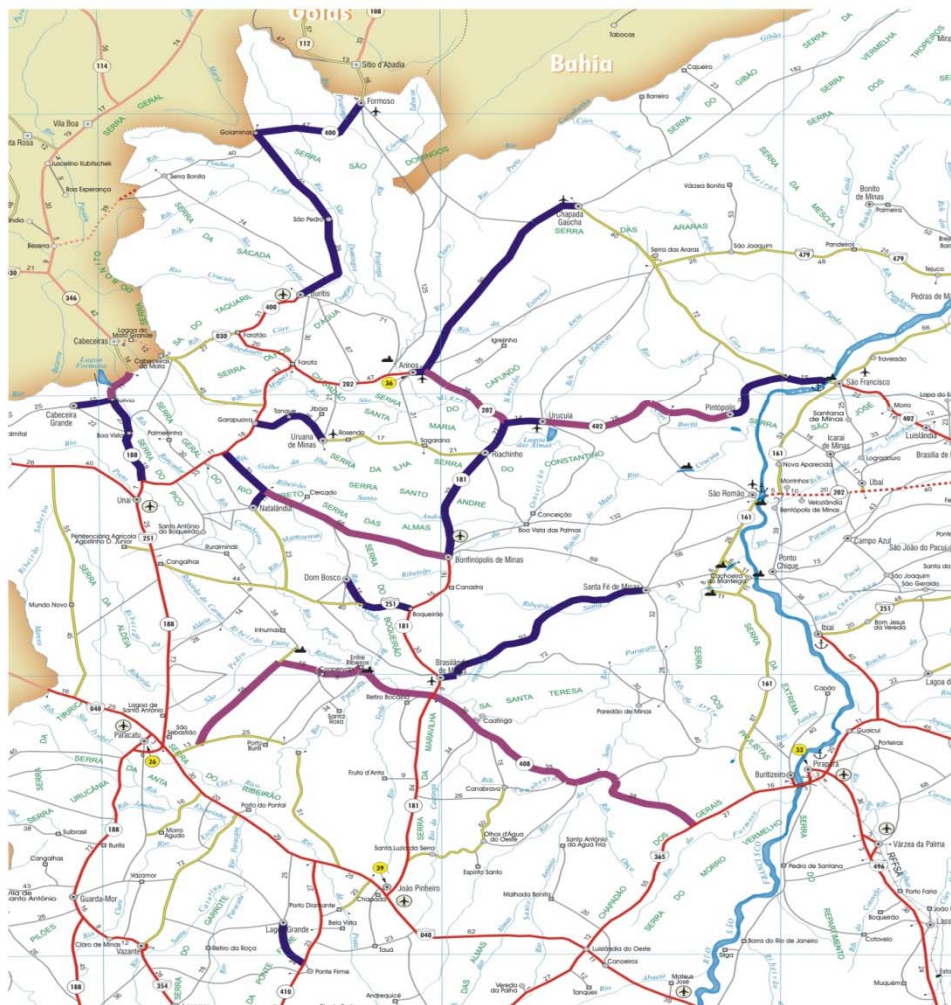

### Resumo

 PROCESSO

 Projetos

<b>PROCESSO</b>	621 km
<b>Projetos</b>	406 km
