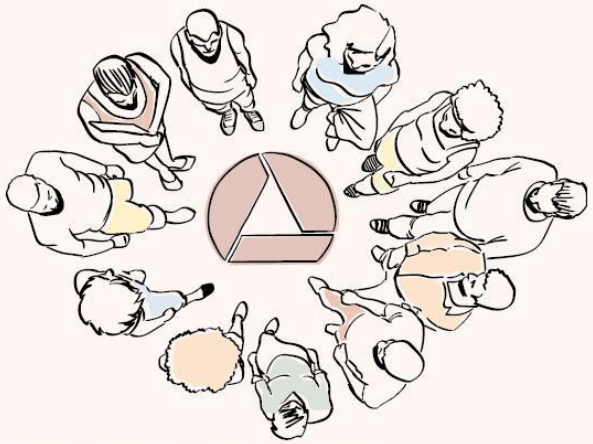


PPAG 2024 2027

DISCUSSÃO PARTICIPATIVA

Revisão para 2027

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

Poder e voz do cidadão

PROGRAMA 0133 - MINAS GERAÇÃO DE VALOR

PPAG 2024 2027 DISCUSSÃO PARTICIPATIVA Revisão para 2027

Principais Entregas em 2026

» Ação 3018 – Gás competitivo – expansão da rede de gás canalizado

- **Investimentos consolidados: R$ 111,8 milhões** realizados de janeiro a setembro de 2026 (R$ 12,4 milhões/mês), ante R$ 191,6 milhões orçados para 2026. Nova expectativa para 2026: **R$ 135,2 milhões**.
- **Rede construída: 98 km** realizados de janeiro a setembro de 2026, ante 89 km orçados para 2026. Nova expectativa para 2026: **121 km**.
- **Eficiência na realização da ação:** mais quilômetros de rede com menos recursos investidos.

» Destaques por projeto (realizado até set./26)

- **Projeto Centro-Oeste:** gasoduto que leva gás natural ao Centro-Oeste mineiro, com linhas laterais para Juatuba, Divinópolis e Betim – **41 km de rede** e **R$ 61,2 milhões**.
- **Redes urbanas:** ampliação das redes nas cidades atendidas, levando gás canalizado a mais residências e comércios – **14 km de rede** e **R$ 26,7 milhões**.
- **Expansão urbana e novos clientes:** ligação de novos clientes residenciais, comerciais e industriais nas áreas atendidas pela rede de gás – **43 km de rede** e **R$ 23,4 milhões**.
- **Biometano no Triângulo Mineiro:** biometano produzido e levado ao Triângulo, distribuído por redes isoladas – quantidade prevista de **50 mil m³/dia** e **R$ 0,5 milhão** realizados.

PROGRAMA 0133 - MINAS GERAÇÃO DE VALOR

PPAG 2024 2027
DISCUSSÃO PARTICIPATIVA
Revisão para 2027

Metas Regulatórias – Ciclo 2022-2026

» Compromissos do ciclo

Compromissos	Meta	Realização
Rede construída a partir de 2022 (km)	491	**547**
Mesorregiões atendidas	7	**7**
Clientes atendidos	100.000	**109.931**

» Investimentos do ciclo

Investimento no Ciclo 2022-2026	Valor
Proposto pela Gasmig	R$ 2,507 bilhões
Aprovado pelo Regulador	R$ 1,216 bilhão
Realizado pela Gasmig[1]	**R$ 1,333 bilhão**

Valores em moeda de 2026.
[1] Valores projetados até dez./26 e realizados até ago./26.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
Poder e voz do cidadão

PROGRAMA 0133 - MINAS GERAÇÃO DE VALOR

PPAG 2024 2027 DISCUSSÃO PARTICIPATIVA Revisão para 2027

Entregas previstas para 2027

» Ação 3018 – Gás competitivo – expansão da rede de gás canalizado

- **Investimentos previstos:** R$ 457,7 milhões no programa atual orçado para 2027. Nova expectativa para 2027: **R$ 255 milhões**.
- **Rede a ser construída:** 171 km no programa atual orçado para 2027. Nova expectativa para 2027: **131 km**.
- Grandes projetos dependem de **liberação ambiental** e de **negociação com o transportador de gás**.

» Destaques previstos (valor projetado para 2027)

- **Biometano no Triângulo Mineiro:** biometano produzido e levado ao Triângulo, distribuído por redes isoladas – **R$ 19 milhões**.
- **Projeto Expansão Sul de Minas:** conexão entre Extrema e Pouso Alegre com rede de gás, considerando a realização de projeto e desimpedimentos ambientais – **R$ 6 milhões**.
- **Redes urbanas:** ampliação das redes nas cidades atendidas, levando gás canalizado a mais residências e comércios – **R$ 88 milhões**.
- **Outros investimentos:** continuidade do Projeto Centro-Oeste, operação no Vale do Aço, infraestrutura, suporte e tecnologia – **R$ 142 milhões**.
