



AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015




**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão




Programa Infraestrutura de Defesa Social

1. **Gerente do Programa:** Denilson Feitoza Pacheco
2. **Objetivo do Programa:** Prover infraestrutura adequada à execução eficaz das políticas públicas de segurança por meio da expansão da infraestrutura predial do sistema prisional e socioeducativo com vistas à melhoria da qualidade do atendimento prestado ao adolescente autor de ato infracional, ao preso e ao recuperando; e da renovação periódica e distribuição no espaço territorial da frota das polícias civil e militar, a partir da aquisição de viaturas adequadas ao trabalho operacional para garantir a eficiência da manutenção da frota.
3. **Projetos/Processos que compõe o Programa:**
 1. Projeto: Atendimento às Medidas Socioeducativas
 2. Projeto: Humanização do Sistema Prisional e Implantação de APAC
 3. Projeto: Modernização do Sistema Prisional



Programa Infraestrutura de Defesa Social


4. Projeto: Gestão da frota da Polícia Civil
5. Processo: Gestão Terceirizada da Frota Da Polícia Militar
 6. Processo: Atendimento ao adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional
 7. Processo: Custódia e Ressocialização de Presos




Projeto Atendimento às Medidas Socioeducativas

1. **Gerente do Projeto:** Camila Silva Nicácio
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** Qualificar o sistema socioeducativo promovendo a adequação e celeridade no atendimento inicial ao adolescente autor de ato infracional a fim de propiciar o rompimento com a prática infracional e redução da sensação de impunidade.

AUDIÊNCIA PÚBLICA



Estrutura Analítica do Projeto



Monitoramento da execução


AÇÃO: 1206 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

Produto: CENTRO SOCIOEDUCATIVO CONSTRUÍDO

Unidade de Medida:

UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Noroeste de Minas	1	0	0,00	5.000.000,00	1.317.034,84	26,34
Total	1	0	0,00	5.000.000,00	1.317.034,84	26,34



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012


✓ Expansão da cobertura das medidas de meio aberto (270 novas vagas):

- Município de Oliveira (60 vagas)
- Município de Sete Lagoas (100 vagas)
- Município de Viçosa (30 vagas)
- Município de Pompéu (30 vagas)
- Município de Pedro Leopoldo (40 vagas)

Andamento da Construção do CSE
Unaí. (fotos de Agosto/12).

Previsão de término da obra em
Novembro de 2012.






Projeto Humanização do Sistema Prisional e Implantação de APAC

1. **Gerente do Projeto:** Murilo Andrade de Oliveira
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** Fomentar a criação de novos centros de internação com a metodologia "APAC", possibilitando um atendimento mais humanizado ao preso e menos oneroso ao Estado. Investindo em ações de cunho educacional e profissional, potencialização a ressocialização do custodiado após passagem pelo sistema prisional.


AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015



Estrutura Analítica do Projeto




Monitoramento da execução

AÇÃO: 1291 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE APAC

Produto: VAGA CRIADA

Unidade de Medida: VAGA


Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	30	0	0,00	708.747,00	52.535,66	7,41
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	15.384,86	-
Mata	120	0	0,00	2.008.118,00	9.307,28	0,46
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	16.766,48	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	12.221,60	-
Alto Paranaíba	80	0	0,00	1.063.121,00	9.270,50	0,87
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	4.394,12	-



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012


✓ Vagas criadas em APACs

- Manhuaçu (Zona da Mata) – 120 vagas
 - Inaugurada em 15 de junho de 2012
- Sacramento (Alto Paranaíba) – 80 vagas
 - Previsão de inauguração em setembro de 2012



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012






Projeto Modernização do Sistema Prisional

1. **Gerente do Projeto:** Murilo Andrade de Oliveira
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** Erradicação das Carceragens da Polícia Civil, com a liberação destes profissionais para a execução de suas atividades fins. Ampliação do número de vagas ofertadas pela SUAPI, reduzindo o déficit de vagas no Estado de Minas Gerais, de forma a interferir positivamente na melhoria de qualidade de vida da população carcerária e em sua ressocialização. Aprimoramento e modernização do modelo de custódia prisional mediante alternativas inovadoras, como PPP e monitoramento eletrônico, buscando, inclusive, redução dos custos para o Estado e melhoria na qualidade do atendimento prestado. Garantir realização de revistas mais eficientes e humanizadas com a utilização de aparelhos de scanner corporal.


AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015



Estrutura Analítica do Projeto




Monitoramento da execução

AÇÃO: 1197 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Produto: VAGA CRIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	2.200	0	0,00	200.000,00	97.516,01	48,76
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	22.883,60	-
Centro Oeste	0	0	0,00	38.850.000,00	0,00	0,00
Total	2.200	0	0,00	39.050.000,00	120.399,61	0,31




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

✓ Unidade PPP

- Inauguração de 02 unidades: 1216 vagas
 - Previsão de entrega em dezembro de 2012
- Contratação do verificador independente
 - Início de repasse em junho de 2012
- Acesso PPP
 - Previsão de entrega em dezembro de 2012

✓ Monitoramento Eletrônico de Presos


- Possibilidade de até 352 presos monitorados
 - Previsão de início em outubro de 2012




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

✓ Criação de vagas

- Construção do Presídio de Oliveira: 302 vagas
 - Previsão de entrega em outubro de 2012
- Ampliação do Presídio de São Lourenço: 80 vagas
 - Entregue em 02 de fevereiro
- Ampliação da Penitenciária de Três Corações: 148 vagas
 - Entregue em 15 de fevereiro
- Ampliação do Presídio de São Lourenço: 100 vagas
 - Entregue em 01 de março
- Casa de Albergado de Pouso Alegre: 40 vagas
 - Previsão de entrega em outubro de 2012
- Ampliação do Presídio de Poços de Caldas: 48 vagas,
 - Entregue no dia 15/05/12

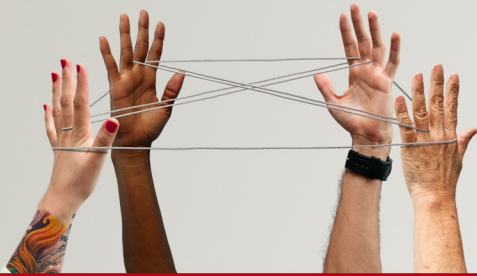

Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

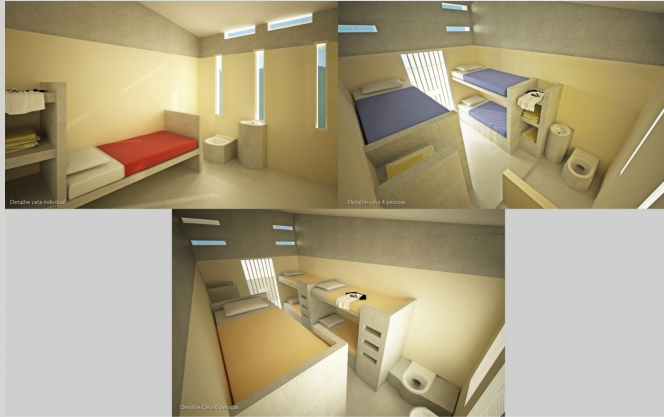


Paço Lúcio de Brito
Márcia Odebrecht
ARQUITETOS ASSOCIADOS

Arquiteto Responsável:
Márcia Odebrecht
Projeto de Arquitetura:
Márcia Odebrecht

SEMPRE ENTREGANDO
SOLUÇÕES INOVADORAS ASSOCIADOS
ARQUITETOS ASSOCIADOS
PROFESSORES

G P A

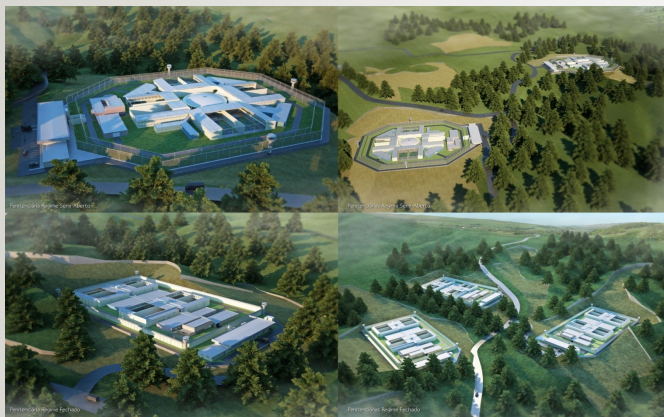

Paço Lúcio de Brito
Márcia Odebrecht
ARQUITETOS ASSOCIADOS

Arquiteto Responsável:
Márcia Odebrecht
Projeto de Arquitetura:
Márcia Odebrecht

SEMPRE ENTREGANDO
SOLUÇÕES INOVADORAS ASSOCIADOS
ARQUITETOS ASSOCIADOS
PROFESSORES

G P A



Paço Lúcio de Brito
Márcia Odebrecht
ARQUITETOS ASSOCIADOS

Arquiteto Responsável:
Márcia Odebrecht
Projeto de Arquitetura:
Márcia Odebrecht

SEMPRE ENTREGANDO
SOLUÇÕES INOVADORAS ASSOCIADOS
ARQUITETOS ASSOCIADOS
PROFESSORES

G P A




Paço Lúcio de Brito
Márcia Odebrecht
ARQUITETOS ASSOCIADOS

Arquiteto Responsável:
Márcia Odebrecht
Projeto de Arquitetura:
Márcia Odebrecht

SEMPRE ENTREGANDO
SOLUÇÕES INOVADORAS ASSOCIADOS
ARQUITETOS ASSOCIADOS
PROFESSORES

G P A




Projeto Gestão da frota da Polícia Civil

1. **Gerente do Projeto:** Andrea Claudia Vacchiano
2. **Órgão Responsável:** Polícia Civil de Minas Gerais
3. **Objetivo do Projeto:** O projeto consiste na elaboração de uma nova metodologia para a redução do tempo de manutenção das viaturas, que possibilite uma redução dos custos e melhor utilização das viaturas que existem. Além disso, será feita a compra de novas viaturas com estruturas específicas para transporte de cadáveres a unidades de polícia, com as devidas especificações que possibilitam a adequada conservação do corpo, sem a perda de importantes informações de perícia.


AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015



Estrutura Analítica do Projeto




Monitoramento da execução

AÇÃO: 4639 - GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: ESTUDO / PROJETO


Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
<i>Central</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Gestão da manutenção
 - Diagnóstico da frota concluído

- ✓ Aquisição de viaturas
 - Previsão aquisição de cerca de 25 rabeções até o final do ano.




Processo Gestão Terceirizada da Frota Da Polícia Militar

1. **Gerente do Projeto:** Tenente Coronel César Ricardo de Oliveira Guimarães
2. **Órgão Responsável:** Polícia Militar de Minas Gerais
3. **Objetivo do Projeto:** Renovar a frota da PMMG com a manutenção do modelo de terceirização da gestão e manutenção visando a redução dos custos de manutenção, da idade média, do índice de indisponibilidade da frota, com aumento da capacidade operacional das diversas unidades da PMMG, por meio da redistribuição das viaturas das unidades atendidas para os municípios do interior do estado.


AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015



Estrutura Analítica do Processo




Monitoramento da execução

AÇÃO: 4572 - GESTÃO TERCEIRIZADA DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR

Produto: VIATURA MANTIDA

Unidade de Medida: VIATURA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	592	595	100,51	22.974.133,00	12.050.881,92	52,45
Rio Doce	70	70	100,00	2.716.536,00	715.879,78	26,35
Mata	68	65	95,59	2.638.921,00	664.745,52	25,19
Sul de Minas	75	75	100,00	2.910.575,00	767.014,10	26,35
Triângulo	80	80	100,00	3.104.613,00	818.148,29	26,35




Projeto Custódia e Ressocialização de Presos

1. **Gerente do Projeto:** Murilo Andrade de Oliveira
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** A gestão das vagas é o ponto inicial deste processo, que suscita a realização do atendimento ao preso e, portanto, a gestão de sua custódia e potencialização da ressocialização, para isso, há a gestão da infraestrutura e segurança prisionais e da custódia em Unidades Prisionais (UP). Para dar suporte, ocorre em paralelo a gestão da frota e das informações e qualidade.


AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015



Estrutura Analítica do Processo




Monitoramento da execução

AÇÃO: 4379 - CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS

Produto: PRESO CUSTODIADO


Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	18.253	18.771	102,84	372.924.710,00	194.310.295,02	52,10
Rio Doce	3.324	3.318	99,82	62.430.876,00	23.698.884,23	37,96
Mata	4.282	4.383	102,36	87.166.403,00	31.778.894,65	36,46
Sul de Minas	4.404	4.687	106,43	63.156.707,00	38.381.601,21	60,77
Triângulo	3.755	3.710	98,80	63.269.562,00	18.360.355,85	29,02
Alto Paranaíba	1.577	2.045	129,68	36.576.015,00	12.896.668,02	35,26
Centro Oeste	2.113	1.697	80,31	33.177.315,00	14.709.067,24	44,33
Noroeste de Minas	1.382	1.291	93,42	25.233.813,00	10.651.018,76	42,21
Norte de Minas	1.866	2.094	112,22	37.196.325,00	15.241.523,49	40,98
Jequitinhonha / Mucuri	1.492	1.490	99,87	29.472.296,00	14.592.769,04	49,51
Total	42.448	43.486	102,45	810.604.022,00	374.621.077,51	46,22




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Presos custodiados
 - 43.256
- ✓ Presos trabalhando
 - 12.505
- ✓ Presos estudando
 - 6.164
- ✓ Veículos em atividade
 - 574



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012






Processo Atendimento ao adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional

1. **Gerente do Projeto:** Giselle da Silva Cyrillo
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** Qualificar o atendimento, de forma a propiciar a responsabilização do adolescente pelo ato cometido e buscar a ruptura com a prática infracional.


AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015



Estrutura Analítica do Processo




Monitoramento da execução

AÇÃO: 4092 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: ADOLESCENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	960	1.140	118,75	1.667.368,00	822.029,13	49,30
Rio Doce	60	60	100,00	104.211,00	0,00	0,00
Mata	120	120	100,00	208.421,00	135.050,00	64,80
Sul de Minas	280	210	75,00	486.316,00	76.500,00	15,73
Triângulo	120	120	100,00	208.421,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	120	120	100,00	208.421,00	103.099,50	49,47
Centro Oeste	0	60		0,00	54.000,00	-
Noroeste de Minas	60	0	0,00	104.210,00	0,00	0,00
Norte de Minas	180	100	55,56	312.632,00	95.277,04	30,48
Jequitinhonha / Mucuri	0	60		0,00	80.313,75	-
Total	1.900	1.990	104,74	3.300.000,00	1.366.269,42	41,40




Monitoramento da execução

AÇÃO: 4321 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: ADOLESCENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	576	546	94,79	57.720.402,00	47.615.920,95	82,49
Rio Doce	80	109	136,25	8.384.643,00	620.003,31	7,39
Mata	56	104	185,71	6.158.259,00	2.856.564,42	46,39
Triângulo	130	170	130,77	14.683.229,00	868.327,55	5,91
Alto Paranaíba	44	24	54,55	4.232.155,00	537.233,92	12,69
Centro Oeste	48	60	125,00	6.158.259,00	497.963,93	8,09
Norte de Minas	120	118	98,33	12.616.798,00	832.161,61	6,60
Jequitinhonha / Mucuri	32	33	103,13	4.232.155,00	291.605,52	6,89



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012


Convênios de Meio Aberto

Município	Vagas
Araxá	60
Belo Horizonte	400
Betim	120
Contagem	300
Governador Valadares	60
Itabira	60
Itajubá	30
Lavras, Ijaci, Luminárias e Ribeirão Vermelho	40
Montes Claros	100
Muriaé	120
Nova Lima, Rio Acima e Raposos	60
Oliveira	60
Ouro Preto	40
Pará de Minas	60
Passos	60
Patos de Minas	60
Pedro Leopoldo	40
Poços de Caldas	60
Pompéu	30
Sete Lagoas	100
Teófilo Otoni	60
Uberaba	120
Viçosa	30
TOTAL	2070

AÇÃO: 4092

Manutenção da Política de Meio Aberto e CIA-BH

- ✓ Manutenção de 18 convênios para execução das medidas de meio aberto;
- ✓ Pactuação de 5 novos convênios para execução das medidas de meio aberto, aumentando o número de vagas para 2070 em agosto de 2012;
- ✓ Manutenção do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional em Belo Horizonte, onde 82% dos adolescentes são encaminhados às audiências judiciais em até 48 horas após a apreensão pela autoridade policial.



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012


AÇÃO: 4321

Manutenção da Política de Meio Fechado

- ✓ Média mensal de 785 adolescentes matriculados em escola formal e com frequência mínima de 75% das aulas;
- ✓ 621 adolescentes devidamente matriculados em cursos de formação básica para o trabalho e com frequência comprovada de 75% ;
- ✓ Média mensal de 1.414 atendimentos de saúde realizados;
- ✓ Média mensal de 818 adolescentes com ao menos um atendimento técnico individual por semana;



- ✓ Ocorrência de uma rebelião em todo o sistema socioeducativo até o momento



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

AÇÃO: 4321

Manutenção da Política de Meio Fechado

- ✓ Média mensal de 1.131 adolescentes inseridos em atividades de esporte, cultura e lazer;
- ✓ Média mensal de 190 adolescentes egressos das medidas de privação e semiliberdade atendidos e encaminhados para atividades de educação, educação profissional, trabalho e renda, saúde, bem como de esporte, cultura e lazer e trabalho com as famílias.

